公司及项目名称、评价类型：

淄博新塑化工有限公司--安全现状评价报告

企业及项目简介：

淄博新塑化工有限公司成立于1997年8月8日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人张志传，注册资本陆仟万元整，位于山东省淄博市张店区冯北路5号，其经营范围包括许可项目：危险化学品经营；危险化学品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新型催化材料及助剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

淄博新塑化工有限公司现有聚烯烃催化剂项目等生产装置，主要产品为聚烯烃催化剂、塑料复合助剂等，无中间产品，各生产装置产品均不属于危险化学品。依据《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》进行辨识，本公司原料中涉及的危险化学品年设计用量均低于《危险化学品使用量的数量标准》（2013年版）的年使用量，其他原料不在《危险化学品使用量的数量标准》（2013年版）中，因此企业不需要办理危险化学品使用许可证。

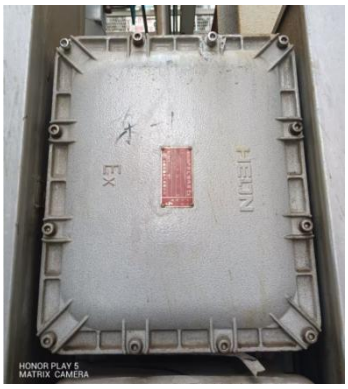
根据国家有关法律、法规和现行标准、规范，对淄博新塑化工有限公司进行了安全现状评价，评价组通过现场调研和对工程资料的详细分析讨论得出如下结论：

淄博新塑化工有限公司所在地的安全条件良好，与周边的安全防护距离符合国家相关规范的要求；建立了相应的安全管理机构，安全管理人员的配备符合《安全生产法》等法律法规的要求，建立健全了相应的安全管理规章制度并在生产中得到落实，安全资金投入符合有关规定，厂区布局基本合理，采用的工艺和设备成熟可靠，有相应的工艺操作规程和设备管理制度，生产工艺中采用了一定的安全技术措施。

	姓名	安全评价师 （填写执业证书号）	是否为 注册安全工程师
项目负责人	张光玉	1100000000100253	是
项目组成员	辛兴林	1800000000300758	是
	张　振	20170333703320133730010028 32	是
	岳攀峰	201810033370001104	是

	孙　鲁	201703337033201537050400192O	是
	姚闪闪	1800000000300742	是
报告编制人	姚闪闪	1800000000300742	是
报告审核人	祝培松	0800000000101022	是
技术负责人	韩　宾	1100000000100190	是
过程控制负责人	王国平	1100000000302223	是
技术专家	无	专业	/
到现场开展安全评估工作情况	时间	到现场人员	主要任务
	2025 年 10 月	张光玉、姚闪闪	现场检查、检查等
安全现状报告提交时间：2026 年 4 月 7 日			
评价方法：安全检查表法、作业条件危险性分析法			
通过本次评价，评价组认为：淄博新塑化工有限公司的生产条件符合相关安全生产法律法规的要求，具备安全生产的条件。			

序号	存在的主要问题和隐患	整改措施	整改落实情况	整改照片	整改结果

1	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置室外装置区一层中间罐区东侧电缆桥架处一接线盒电源线接线处未可靠密封。	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置室外装置区一层中间罐区东侧电缆架处接线盒电源线接线处已可靠密封。			符合
2	300 吨/年聚烯烃催化剂生产装置内防爆接线盒紧固螺栓缺失。	企业已补全 300 吨/年聚烯烃催化剂深恶国产装置内防爆接线盒紧固螺栓。			
3	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置一层四氢呋喃中间罐区人体静电释放仪故障。	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置一层四氢呋喃中间罐区人体经典释放仪已维修，现能正常使用。			
4	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置内 R3121A 反应釜尾气管道标识色现场为黄色，标识色错误。	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置内 R3121A 反应釜尾气管道标识色已改为灰色，并设置了相应标识。			

5	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置内V3105A 精制罐翻板液位计失准。	340 吨/年聚乙烯催化剂生产装置内V3105A 精制罐翻板液位计已校准。			

现场照片：1-2 张



